

Interimscontainer Neubau BSZ Bad Windsheim

1. Information über die Ausschreibungsergebnisse
2. Aktueller Baustand Interimscontainer

1.1 Ausschreibungsergebnis Containerbeschaffung

- Landrat Dr. von Dobschütz wurde mit der Vergabe im Kreisausschuss am 08.12.2025 ermächtigt
 - Ausschreibung im offenen Verfahren VOB/A (EU)
 - Download der Angebotsunterlagen von 42 Bewerbern
 - Submission am 22.04.2026 mit 19 Angeboten
 - Ausgeschrieben wurde der Kauf der benötigten Containeranlage
 - Kostenansatz in der Kostenberechnung lag bei 1.371.552,89 €
 - Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Recon mit Angebotssumme von 1.454.180,00 € (ohne Vergabe Wartung Brandmeldeanlage und Heiz-Kühlsystem)
 - Kostenmehrung im Vergleich zur Kostenberechnung 82.627,11 €
- Vergabe an Fa. Recon, Industriestraße 2, 91325 Adelsdorf (Containerkauf)

1.2 Ausschreibungsergebnis Unterbau

- Landrat Dr. von Dobschütz wurde mit der Vergabe im Kreisausschuss am 08.12.2025 ermächtigt
 - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb nach VOB/A (Abschnitt 1)
 - Es wurden sieben Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert
 - Submission am 21.05.2026 mit zwei Angeboten
 - Leistungsbild Erdarbeiten, Erstellung Fundamente und Pflasterarbeiten im Umgriff der Containeranlage
 - Kostenansatz in der Kostenberechnung lag bei 140.733,99 €
 - Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Gerhäuser mit Angebotssumme von 239.730,09 €
 - Kostenmehrung im Vergleich zur Kostenberechnung 118.255,97 €.
 - Kostenmehrungen hauptsächlich durch zusätzlich benötigte Pflasterfläche um die Containeranlage herum sowie die Herstellung einer Baustraße zum Antransport der Containeranlage
- Vergabe an Fa. Georg Gerhäuser GmbH, Ipsheimer Straße 6, 91438 Bad Windsheim


1.3 Ausschreibungsergebnis Elektroarbeiten

- Landrat Dr. von Dobschütz wurde mit der Vergabe im Kreisausschuss am 08.12.2025 ermächtigt
 - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb nach VOB/A (Abschnitt 1)
 - Es wurden sechs Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert
 - Submission am 07.08.2026 mit einem Angebot
 - Leistungsbild Erdarbeiten, Erstellung Fundamente und Pflasterarbeiten im Umgriff der Containeranlage
 - Kostenansatz in der Kostenberechnung lag bei 11.515,00 €
 - Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Gossler mit Angebotssumme von 12.436,23 €
 - Kostenmehrung im Vergleich zur Kostenberechnung 921,23 €
- Vergabe an Fa. Gossler Elektrounternehmen GmbH, Am Käswasen 8, 91456 Diespeck

2. Aktueller Baustellenstand Containeranlage

- Bauzeit 20.07.2026 bis Ende November 2026
- Kostenberechnung der Gesamtmaßnahme lag bei 1.873.397,82 €
- Kostenprognose liegt bei 1.982.940,34 €
- Umzug Berufsschule Anfang Dezember in die Containeranlage
- Folgende Vorbereitungen Unterbau für Containeranlage sind bereits abgeschlossen
 - a) Fundamente für Containeranlage
 - b) Pflasterarbeiten Weg zur Mittelschule
 - c) Strom- und EDV Anschluss an Mittelschule
 - d) Wasseranschluss an vorhandenen Hydranten
 - e) Kranaufstellplatz sowie Baustellenzufahrt über vorhandenen städtischen Gehweg
- Containerstellung ab 05.10.2026 Dauer ca. zwei Wochen
- Danach Innenausbau Containeranlage und Pflasterarbeiten im Umgriff der Containeranlage

2. Aktueller Baustellenstand Containeranlage

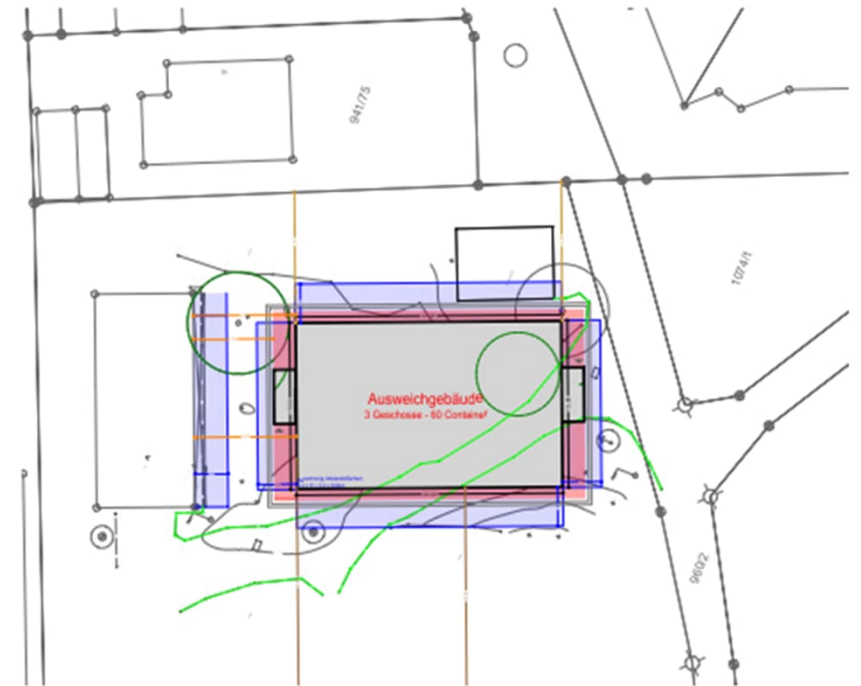

2. Aktueller Baustellenstand



2. Aktueller Baustellenstand

