


Deponiebaumaßnahmen: Uffenheim - Sachstand Endabdichtung und Erweiterung

Sitzung des Ausschusses für
Kreislauf- und Abfallwirtschaft am
13.07.2026

Folie 1, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ->

Luftbild Deponie Uffenheim

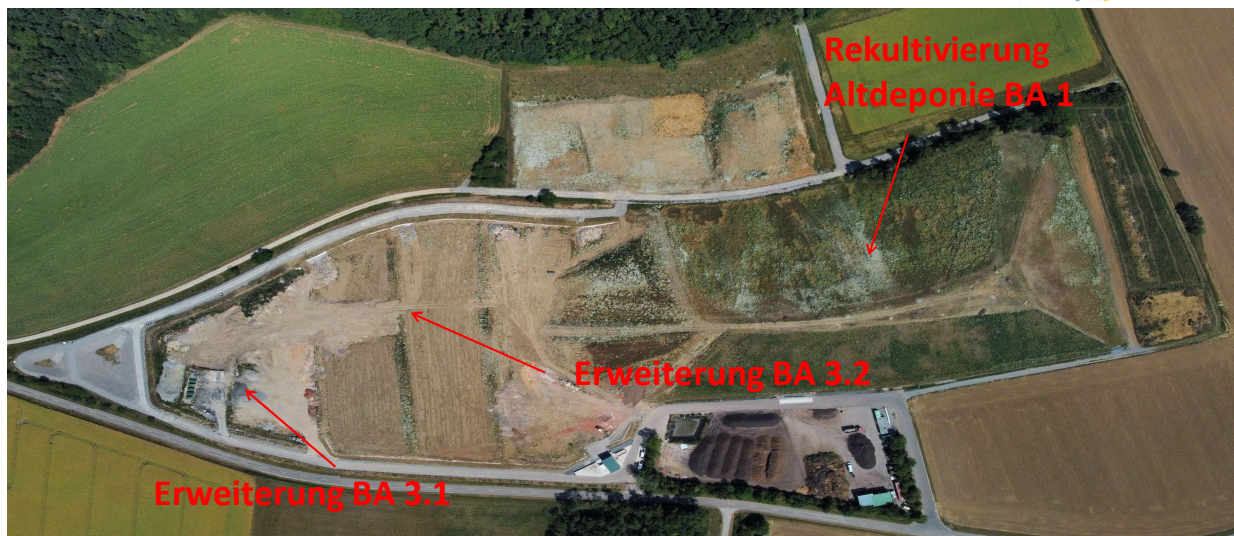

Folie 2, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ->

Quelle: eigene Fotos

Historie



- Im Kreisausschuss KA am 01.10.2014 wurde beschlossen eine **DK0-Deponie außerhalb der EVA** zu suchen, um die Entsorgungssicherung für den Bürger, aufgrund von schließenden gemeindlichen Deponien, langfristig zu gewährleisten
- **Durchgeführte Standort-, Eignungs-, und Kostenanalysen** präferierten den Standort Deponie Uffenheim „Bei den drei Kreuzen“, zumal eine mögliche Erweiterung der Deponie Uffenheim bereits plangenehmigt, also eine geeignete geologische Barriere vorhanden, jedoch noch nicht erschlossen war
- Der **Kauf der Deponie** inkl. Kompostplatz auf einer Gesamtfläche von ca. 108.000 m² wurde am 30.09.2019 im Kreisausschuss beschlossen
- **Übernahme des Standortes inkl. Kompostplatz ab 01.01.2020** und zeitnahe Aufnahme der Planung der Erweiterung und Rekultivierung in zwei Projektphasen mit Planungsfirma Coplan
- Durchführung hydrogeologischer, archäologischer Gutachten, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und geomagnetischer Sondierung nach Kampfmitteln (BA 3.2)

Folie 3, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ->



Projektphase 1

BA 3.1 Hauptbauzeitraum von Mai bis Dezember 2022

- **Bau Kassetten 1 & 2** mit Ablagerungsvolumen von ca. 45.000 m³
- Sickerwassersystem mit **Sickerwasserrückhaltebecken SRB1** (41 l/s)
- Oberflächenwassersystem mit **Regenrückhaltebecken RRB1** (26 l/s)
-> Drosselung und Einleitung in den Schellenbach
- **Erstellung der Infrastruktur** wie Sozialcontainer (prov. Wasseranschluss), Stromanschluss und Toranlage
- **Abfallrechtliche Abnahme** erfolgte am 25.05.2023 und Inbetriebnahme neuer Kassetten am 01.06.2023
- Abschließend **Umsetzung Naturschutzauflagen**
-> Nistkörbe Waldohreule, Pflanzungen auf dem Gelände und Ausgleichsfläche in Herbolzheim, Ersatzhabitat Zauneidechse

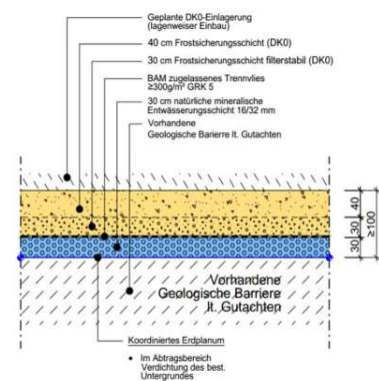


Abbildung 4 Regelaufbau Deponiebasis

Quelle: Auszug aus Genehmigungsplanung

Folie 4, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ->



Erweiterung BA 3.1



Quelle: eigene Fotos

Folie 5, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ->



Projektphase 2

BA 1/ 3.2 Hauptbauzeitraum von Mai 2024 bis Dezember 2025



- Das Gelände wurde an die **Wasser- und Abwasserleitungen** der Stadt Uffenheim angeschlossen, eine **Fahrzeugwaage** eingebaut und der **Waagecontainer** aufgestellt, Fahrwege wurden neu angelegt und **asphaltiert**
- Implementierung der **Waagesoftware EMOS** (analog Dettendorf) und Zahlung bar, per Rechnung und EC-Cash möglich
- Bau **vier weiterer Kassetten** mit Einlagerungsvolumen von ca. 425.000 m³ (geschätztes freies Lagervolumen bei aktuellen Aufkommen bis in die 2070er Jahre)
- **Rekultivierung der Altdeponie** mit 1,20 m (statt 1,0 m) starken Rekultivierungsschicht aus Erdaushub des Kassettenbaus inkl. Bau Zauneidechsenhabitat und Entfernung Staudenknöterich (9.200 statt 1.500 m³); Ableitung Oberflächenwasser über Graben/Drosselbauwerke in den Schellenbach
- Bau eines **Tank- und Waschplatzes** mit Fahrzeughalle sowie **Containerstellplatz** (Recycling-Material/ DK1)
- **Abfallrechtliche Abnahme** erfolgte am 29.04.2026

Folie 6, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ->



BA 3.2 Erweiterung



Quelle: eigene Fotos

Folie 7, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ->



BA 3.2 Erweiterung




Quelle: eigene Fotos

Folie 8, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ->



BA 1 Rekultivierung

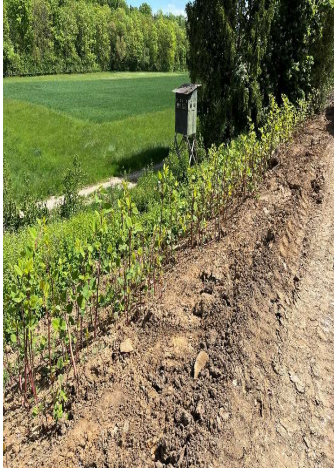

Quelle: eigene Fotos

Folie 9, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim →



Kosten im Überblick



Erweiterung BA 3.1	Kosten (Mio. €)
Planung, Gutachten, Vermessung, Fremdprüfung, Nebenkosten Grundstückserwerb, Baunebenkosten inkl. Infrastruktur (Strom)	1,43
Hauptbauleistungen Fa. Geiger	1,64
Gesamtkosten inkl. Grundstückserwerb (Deponie und Ausgleichsfläche)	3,07

Rekultivierung BA 1 & Erweiterung BA 3.2	Kosten (Mio. €)
Planung, Gutachten, Vermessung, Fremdprüfung, Grundstücke, Baunebenkosten inkl. Infrastruktur (Internet, Wasser, usw.)	1,02
Hauptbauleistungen Fa. Hermanns BA 1 Rekultivierung und BA 3.2 Erweiterung	4,73
Gesamtkosten inkl. Grundstückserwerb (Randbereiche Deponie)	5,75

➤ Deckung der Kosten aus gebildeten Sonderrücklagen

Folie 10, 13.07.2026, Sachgebiet Abfallwirtschaft, Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim →

